


## 8-BOB

# LOYIHA RESURSLARIN I BOSHQARISH

Inson resurslari • jamoa •  
rahbarlik • motivatsiya •  
nizolar

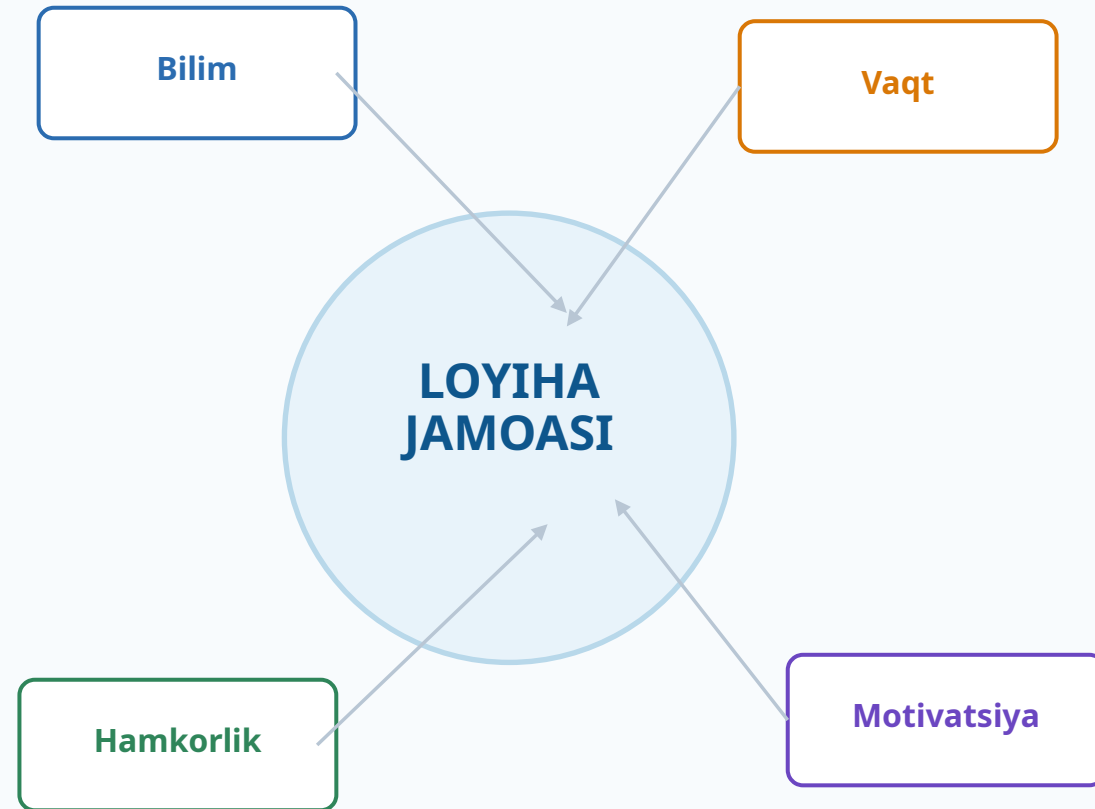

# Mavzu tuzilishi

8-bob doirasidagi asosiy bo'limlar

8-BOB

8.1

**Loyiha resurslarini boshqarish tushunchasi va uning ahamiyati**

8.2

**Inson resurslarini rejalashtirish**

8.3

**Loyiha jamoasini shakllantirish**

8.4

**Loyiha jamoasini rivojlantirish va boshqarish**

# Tayanch iboralar

Mavzuni o'zlashtirish uchun asosiy tushunchalar

## TAYANCH

Loyiha resurslari

Inson resurslari

Inson omili

Resurslarni aniqlash

Resurslarni taqsimlash

Samarali foydalanish

Mutaxassislar ehtiyoji

Rol va vazifalar

Mas'uliyat va vakolat

Loyiha jamoasi

Jamoa dinamikasi

Yetakchilik

Muvofiqlashtirish

Muloqot

Motivatsiya

Nazorat

Nizolarni boshqarish

# Loyiha resurslari nima?

Loyihani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan imkoniyatlar majmui

8.1

1

**INSON**

Mehnat, bilim, tajriba

2

**VAQT**

Muddat va ish vaqti

3

**MODDIY**

Jihoz, material,  
infratuzilma

4

**TEXNIK**

Texnologiya va vositalar

5

**AXBOROT**

Ma'lumot va bilim  
bazasi

**Resurslarni boshqarish — imkoniyatlarni loyiha maqsadiga uyg'unlashtirish jarayoni.**

# Nega inson resurslari markaziy o'rinda?

Rejalarni ishlab chiqadigan, qaror qiladigan va natijani yaratadigan — inson

8.1

## **Qaror va reja**

Loyiha rejasi, ustuvorliklar va muammolarga javob inson tomonidan shakllantiriladi.

## **Bilim va tajriba**

Bir xil vazifa turli malakaga ega xodimlar tomonidan turlicha sifat va tezlikda bajariladi.

## **Motivatsiya va hamkorlik**


Jamoa munosabatlari, yetakchilik va nizolarni hal etish loyiha natijasiga bevosita ta'sir qiladi.

**Inson resurslarini samarali boshqarishsiz boshqa boshqaruv yo'nalishlari kutilgan natijani bermasligi mumkin.**

# Resurslarni boshqarishning asosiy maqsadi

Har bir resursdan o'z vaqtida, o'z o'rnida va maksimal samaradorlik bilan foydalanish

8.1



## Son emas — moslik

Inson resurslarida xodimlar soni bilan birga malaka, tajriba va motivatsiya ham hisobga olinadi.

## Tizimli yondashuv

Resurslar loyiha hajmi, jadvali, byudjeti va sifat talablari bilan uyg'un rejalashtiriladi.

## Doimiy boshqaruv

Resurslardan foydalanish loyiha davomida kuzatiladi va zarur hollarda qayta taqsimlanadi.

# Resurslar noto'g'ri boshqarilsa nima bo'ladi?

Mukammal jadval va byudjet ham yetarli bo'lmaydi

8.1

## Kechikish

Kerakli mutaxassis yoki resurs o'z vaqtida mavjud emas.

## Sifat pasayishi

Malaka vazifaga mos kelmaydi yoki nazorat sust.

## Xarajat ortishi

Ortiqcha resurs yoki noto'g'ri taqsimot byudjetni oshiradi.

## Nizo va takroriy ish

Rollar noaniq bo'lsa vazifalar to'qnashadi yoki takrorlanadi.

**Asosiy xavf: resurs mavjud bo'lishi yetarli emas — u to'g'ri va muvofiqlashtirilgan holda ishlatilishi kerak.**

# Amaliy misol: guruh loyihasi

Talabalar jamoasida vazifalarni aniq taqsimlash

8.1

Ma'lumot yig'ish

**1-talaba**

Aniq mas'uliyat → ishlar bir-birini to'ldiradi

Tahlil qilish

**2-talaba**

Aniq mas'uliyat → ishlar bir-birini to'ldiradi

Taqdimot tayyorlash

**3-talaba**

Aniq mas'uliyat → ishlar bir-birini to'ldiradi

Yakuniy tekshiruv

**Guruh rahbari**

Natija bir butun loyiha sifatida tekshiriladi

**Vazifalar aniqligi — samarali inson resurslari boshqaruvining eng oddiy va kuchli vositalaridan biri.**



8.2

# INSON RESURSLARI NI REJALASHTI RISH

**Kim kerak? Qachon kerak? Qancha muddatga? Qaysi  
vazifa uchun?**

---

Darslikning 8-bobi asosida

# Inson resurslarini rejalashtirishning maqsadi

Loyiha ehtiyojlari bilan mavjud inson salohiyati o'rtasida muvozanat

8.2

## Xodim yetishmasligi

Ishlar kechikadi, mavjud jamoa yuklamasi ortadi va sifat xavfi kuchayadi.

**MUVOZANAT**

## Ortiqcha resurs

Keraksiz jalb etilgan xodimlar loyiha xarajatlarini asossiz oshiradi.

**To'g'ri rejalashtirish: mutaxassis + malaka + jalb etish vaqti + muddat + mas'uliyat.**

# 8.1-rasm. Inson resurslarini rejalashtirish jarayoni

Darslikdagi original chizma


8.2



# Inson resurslarini rejalashtirish jarayoni

Loyiha hajmidan aniq rol va mas'uliyatgacha

8.2



## Bog'liqlik

Rejalashtirish loyiha hajmi va ishlarni tuzilmalashgan reja bilan uzviy bog'lanadi.

## Natija

Har bir rol uchun bilim, ko'nikma, vakolat, jalb etish vaqti va javobgarlik aniqlanadi.

# Inson resurslarining sifat jihatlari

Faqat sonni aniqlash yetarli emas

8.2

## Tajriba

Avvalgi amaliy ishlar va o'xshash loyihalardagi ishtirok

## Kasbiy tayyorgarlik

Vazifani bajarish uchun zarur bilim va ko'nikmalar

## Loyihaga moslik

Sohaviy xususiyatlar va loyiha turiga mos kompetensiya

## Jamoadada ishlash

Muloqot, hamkorlik va mas'uliyat madaniyati

**To'g'ri mutaxassis tanlovi — loyiha risklarini kamaytirish va sifatli natijaga erishish omili.**

# Loyiha jamoasi tarkibini tanlash

Jamoa doimiy, vaqtinchalik yoki tashqi ekspertlardan iborat bo'lishi mumkin

8.2

## Doimiy xodimlar

Tashkilot ichidagi xodimlar.  
Korporativ tajriba va jarayonlarni yaxshi biladi.

## Vaqtincha jalb etilganlar

Loyiha bosqichi yoki muayyan vazifa uchun vaqtincha qo'shiladi.

## Tashqi maslahatchilar

Maxsus ekspertiza yoki noyob bilim zarur bo'lgan holatlarda jalb qilinadi.

**Tanlov mezoni: loyiha murakkabligi + muddati + byudjeti + kerakli kompetensiya.**

# Rol, mas'uliyat va vakolat

Kim nima qiladi, nimaga javob beradi va qanday qaror qabul qila oladi?

8.2

| Tushuncha  | Mazmuni                                     | Savol                               |
|------------|---------------------------------------------|-------------------------------------|
| Rol        | Loyihadagi funksional o'rin                 | Men qanday vazifani bajaraman?      |
| Mas'uliyat | Natija va vazifa uchun javobgarlik          | Qaysi natija uchun javobgarman?     |
| Vakolat    | Qaror qabul qilish va harakat qilish huquqi | Qaysi qarorni mustaqil qila olaman? |

Noaniq rollar → takroriy ishlar, e'tibordan chetda qolgan vazifalar va mas'uliyatdan qochish.

# Talabalar loyihasida inson resurslarini rejalashtirish

Oddiy vazifalar taqsimoti orqali boshqaruv mantig'i

8.2

| Vazifa           | Mas'ul        | Kutilayotgan natija                      |
|------------------|---------------|------------------------------------------|
| Ma'lumot yig'ish | A'zo 1        | Ishonchli manbalar va ma'lumotlar bazasi |
| Tahlil           | A'zo 2        | Xulosa va hisob-kitoblar                 |
| Taqdimot         | A'zo 3        | Tizimli va tushunarli slaydlar           |
| Nazorat          | Guruh rahbari | Yagona standart va muddatga rioya        |

Rejalashtirilgan taqsimot — “hamma hamma ishni qiladi” holatining oldini oladi.



8.3

# LOYIHA JAMOASINI SHAKLLAN TIRISH

## Rejalashtirilgan rollarni real insonlar bilan to'ldirish va yagona jamoa yaratish

---

Darslikning 8-bobi asosida

# Jamoani shakllantirish — faqat xodim tanlash emas

Maqsadga yo'naltirilgan yagona jamoani yaratish jarayoni

8.3

## Kasbiy bilim

Vazifaga mos texnik kompetensiya

## Muloqot

Axborotni aniq yetkazish va tinglash

## Mas'uliyat

Vazifani o'z vaqtida va sifatli bajarish

## Jamoaviy madaniyat

Hamkorlik, ishonch va o'zaro yordam

**Texnik va ijtimoiy omillar birgalikda baholansa, jamoa samaradorligi oshadi.**

# Loyiha jamoasi — dinamik tuzilma

Loyiha bosqichlariga qarab tarkib o'zgarishi mumkin

8.3



|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Loyiha rahbari      | Barcha bosqichlar |
| Tahlilchi           | Boshlash / reja   |
| Texnik mutaxassis   | Ijro              |
| Nazorat mutaxassisi | Ijro / nazorat    |
| Hisobotchi          | Yakunlash         |

Rahbar jamoa tarkibidagi o'zgarishlarni oldindan rejalashtirib, barqarorlikni saqlashi kerak.

# Rollarni to'g'ri taqsimlash

Aniq vazifa + aniq javobgarlik + aniq hisobot

8.3

## Vazifa

Nima bajariladi?

## Mas'ul

Kim bajaradi?

## Vakolat

Qanday qaror qila  
oladi?

## Hisobot

Kimga va qachon  
ma'lumot beradi?

## Natija

Qanday mezon bilan  
qabul qilinadi?

**Noaniq rol — takrorlanadigan ishlar yoki umuman bajarilmay qolgan vazifalar manbai.**

# Shakllanish bosqichida yetakchilik

Dastlabki davrda rahbar yo'naltiruvchi va muvofiqlashtiruvchi rolni bajaradi

8.3

## Maqsadni tushuntirish

Jamoaga loyiha nima uchun amalga oshirilayotgani va qanday natija kutilayotgani aniq yetkaziladi.

## Ish tartibini yaratish

Muloqot, yig'ilishlar, hisobot va qaror qabul qilish qoidalari kelishib olinadi.

## Ishonch va hamkorlik

Jamoa a'zolari bir-biriga moslashadi; ochiq muloqot keyingi nizolarni kamaytiradi.

**Dastlabki uyg'unlashuv — keyingi jamoa samaradorligining poydevori.**

# Jamoani shakllantirishda tashkiliy vositalar

Boshlang'ich vaqt sarfi keyinchalik samaradorlikka aylanadi

8.3

## Tanishtiruv uchrashuvi

A'zolar, rollar va loyiha konteksti bilan tanishtirish

## Loyiha yig'ilishi

Maqsad, jadval va asosiy vazifalarni kelishish

## Vazifa sessiyasi

Ishlar va mas'uliyatlarni muhokama qilish

## Kelishuv qoidalari

Muloqot, hisobot va qaror qabul qilish tartibini belgilash

# Loyiha jamoasini shakllantirish bosqichlari

Ketma-ket va mantiqiy yondashuv

8.3



- 1-bosqich: vazifa uchun zarur mutaxassislik va kompetensiyalar belgilanadi.
- 2-bosqich: bilim, mas’uliyat, muloqot va jamoaviy ishlash qobiliyati asosida nomzodlar tanlanadi.
- 3-bosqich: kim nima uchun javobgar, kimga hisobot beradi — aniq belgilanadi.
- 4-bosqich: loyiha maqsadi, ish tartibi va muloqot qoidalari tushuntiriladi.
- 5-bosqich: yuzaga kelgan kelishmovchiliklar ochiq muloqot orqali boshqariladi.

# Mas’uliyatlarni taqsimlash matritsasi — RAM

Vazifalar va jamoa a’zolari o’rtasidagi mas’uliyatni ko’rsatuvchi jadval

8.3

| Vazifa                   | Rahbar | Tahlilchi | Ijrochi | Nazorat |
|--------------------------|--------|-----------|---------|---------|
| Talablarni aniqlash      | A      | R         | C       | C       |
| Ish rejasini tuzish      | A/R    | C         | I       | C       |
| Asosiy ishlarni bajarish | A      | C         | R       | I       |
| Sifatni tekshirish       | A      | I         | C       | R       |
| Yakuniy topshirish       | A/R    | C         | C       | C       |

R — bajaruvchi (Responsible) A — yakuniy javobgar (Accountable) C — maslahat beruvchi I — xabardor qilinuvchi



8.4

# JAMOANI RIVOJLAN- TIRISH VA BOSHQARIS- H

## Bilim, ko'nikma, motivatsiya va hamkorlikni uzluksiz kuchaytirish

---

Darslikning 8-bobi asosida

# Loyiha jamoasini rivojlantirish nimani anglatadi?

Yaxshi shakllantirilgan jamoa ham rivojlantirilmasa, samaradorligini yo'qotadi

8.4

## Kasbiy salohiyat

Bilim va ko'nikmalarni oshirish

## Hamkorlik

O'zaro ishlash va tajriba almashish

## Sodiqlik

Loyiha maqsadlariga bog'lanish

**Jamoani rivojlantirish — loyiha davomida uzluksiz amalga oshiriladigan jarayon.**

# Jamoani rivojlantirishning asosiy yoʻnalishlari

Darslikdagi jadval mazmuni

8.4

| Yoʻnalish            | Mazmuni                               | Amaliy natija         |
|----------------------|---------------------------------------|-----------------------|
| Bilim va koʻnikmalar | Trening, oʻrganish, tajriba almashish | Ish sifati oshadi     |
| Muloqot              | Ochiq va muntazam aloqa               | Xatolar kamayadi      |
| Motivatsiya          | Ragʻbat, tan olish, ishonch           | Masʼuliyat kuchayadi  |
| Hamkorlik            | Jamoaviy ishlash muhitini yaratish    | Konfliktlar kamayadi  |
| Yetakchilik          | Rahbarlik uslubini moslashtirish      | Jamoa barqarorlashadi |

# Bilim va tajribani oshirish usullari

Jamoani rivojlantirishning amaliy instrumentlari

8.4

| Usul                | Qanday amalga oshiriladi                  |
|---------------------|-------------------------------------------|
| Treninglar          | Qisqa o'quv mashg'ulotlari                |
| Mentorlik           | Tajribali a'zo yangi a'zoga yordam beradi |
| Tajriba almashish   | Jamoa ichida muhokama                     |
| Amaliy topshiriqlar | "O'rganib bajarish" yondashuvi            |

**Maqsad: jamoa bilimini individual tajribadan umumiy loyiha salohiyatiga aylantirish.**

# Muloqotni rivojlantirish

Samarali jamoa = samarali muloqot

8.4

| Muloqot shakli | Maqsadi                     |
|----------------|-----------------------------|
| Yig'ilish      | Muammolarni muhokama qilish |
| Qisqa hisobot  | Ish holatini bilish         |
| Onlayn aloqa   | Tezkor muvofiqlashtirish    |
| Fikr almashish | Yangi g'oyalar              |

Ochiq va muntazam aloqa — xatolarni erta aniqlash va nizolarni kamaytirish vositasi.

# Muloqot sust bo'lsa...

Jamoa samaradorligiga bevosita salbiy ta'sir

8.4

## Ishlar takrorlanadi

Kim nima qilayotgani aniq bo'lmasa, bir xil vazifa bir nechta a'zo tomonidan bajarilishi mumkin.

## Xatolar kech aniqlanadi

Muammo haqida axborot o'z vaqtida tarqalmaydi va tuzatish qimmatlashadi.

## Nizolar kuchayadi

Noto'g'ri tushunish, ishonchsizlik va mas'uliyat bo'yicha tortishuvlar ortadi.

**Muloqot — jamoani bir tizimga bog'lab turuvchi boshqaruv mexanizmi.**

# Loyiha jamoasini boshqarish

Muvofiqlashtirish • nazorat • muammoni hal qilish • motivatsiya

8.4

Vazifalarni muvofiqlashtirish

Ish jarayonini nazorat qilish

JAMOANI  
BOSHQARISH


Jamoani motivatsiyalash

Muammolarni vaqtida hal qilish

## 8.2-rasm. Jamoani boshqarish

Darslikdagi original chizma

8.4

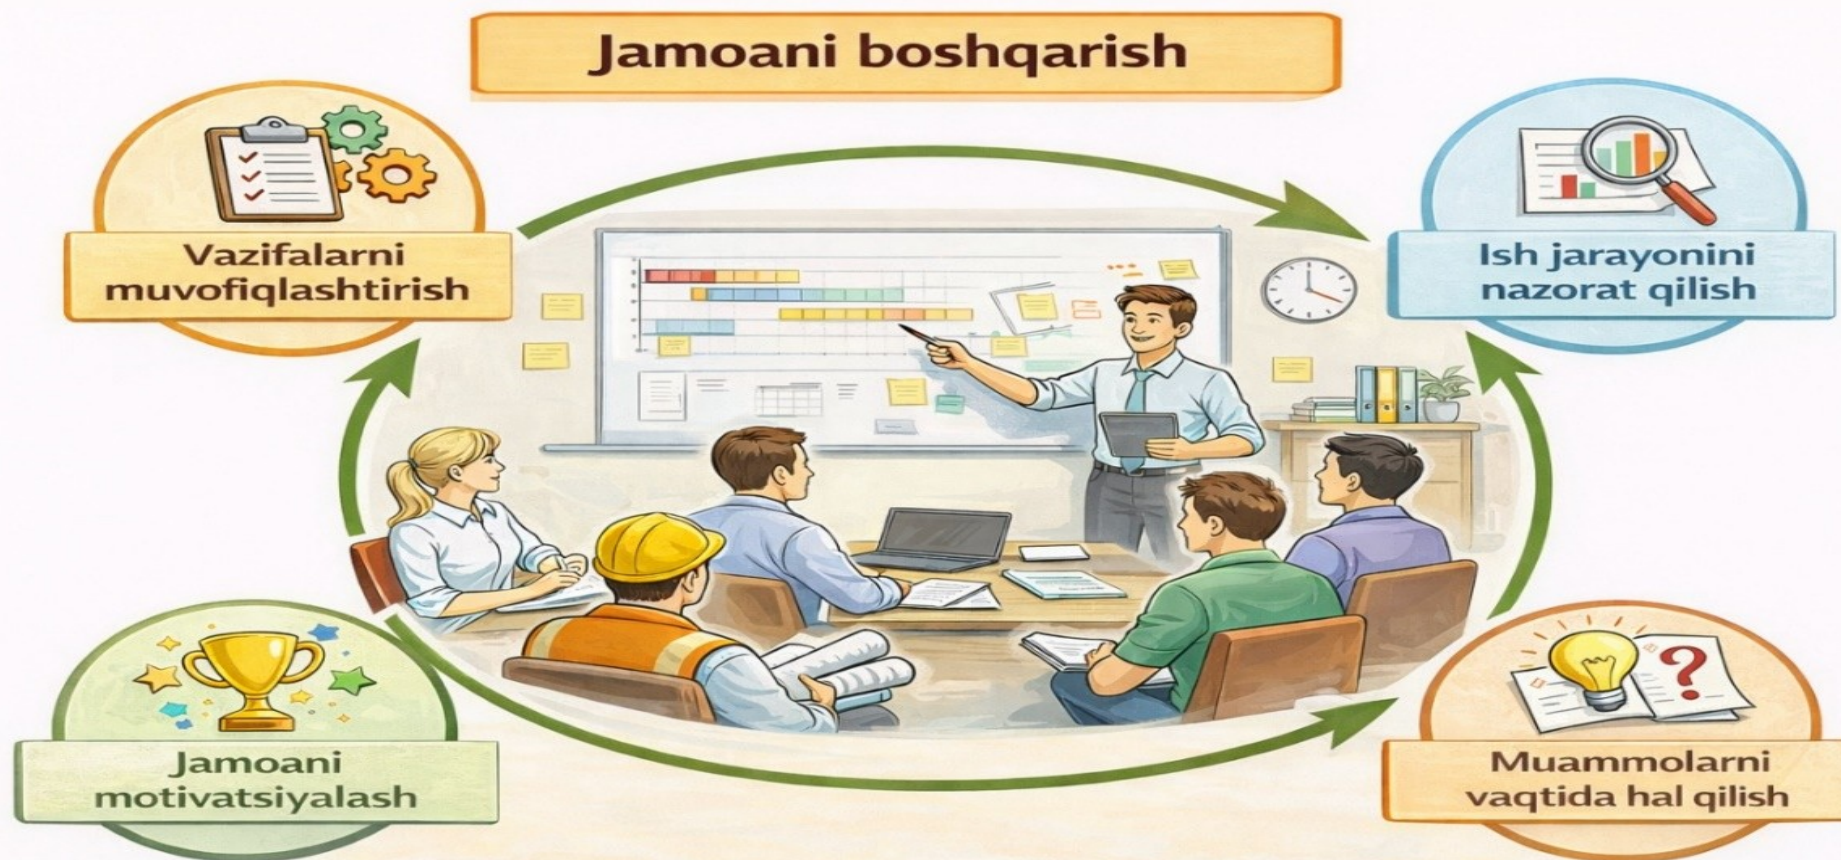



# Rahbarning jamoani boshqarishdagi asosiy rollari

Besh rol bir-birini to'ldiradi

8.4

| Rahbar roli            | Tavsifi                         |
|------------------------|---------------------------------|
| Muvofiqlashtiruvchi    | Ishlarni uyg'unlashtiradi       |
| Yo'naltiruvchi         | Maqsadni eslatib turadi         |
| Qo'llab-quvvatlovchi   | Jamoaga ishonch beradi          |
| Nazorat qiluvchi       | Ish sifatini tekshiradi         |
| Nizolarni hal qiluvchi | Kelishmovchiliklarni boshqaradi |

# 1. Muvofiqlashtiruvchi rahbar

Alohida ishlarni yagona loyiha natijasiga bog'laydi

8.4

- Vazifalar ketma-ketligini — “kimdan keyin kim” — aniqlaydi.
- Ishlar o'rtasidagi bog'liqlikni kuzatadi.
- Vaqt, odam va jihozlarning bir joyda tiqilib qolishini oldini oladi.
- Jamoaga nima va qachon kerakligini oldindan aytadi.
- Turli bo'limlar o'rtasida axborot almashinuvini yo'lga qo'yadi.

## Amaliy misol

Ma'lumot yig'uvchi → tahlilchi → taqdimotchi  
ketma-ketligida topshirish sanalarini belgilaydi.

## Ko'p uchraydigan xato

“Hamma o'zini biladi” deb muvofiqlashtirishni  
sust qilish.

## 2. Yo'naltiruvchi rahbar

Jamoaning e'tiborini asosiy loyiha natijasida ushlab turadi

8.4

- Loyiha maqsadi va kutilayotgan natijani eslatib turadi.
- Ustuvor vazifalarni ajratadi: qaysi ish birinchi, qaysi ish keyin.
- Loyiha doirasidan tashqari keraksiz ishlarni to'xtatadi.
- Qaror uchun mezon beradi: "Bu ish maqsadga xizmat qiladimi?"

### Amaliy misol

Jamoa bezakka ortiqcha vaqt sarflasa: "Avval mazmun, bezak keyin" deb ustuvorlikni tuzatadi.

### Ko'p uchraydigan xato

Maqsadni faqat boshida aytib, keyin jamoa yo'nalishini tekshirmaslik.

### 3. Qo'llab-quvvatlovchi rahbar

Motivatsiya va jamoa ichki barqarorligini saqlaydi

8.4

- Jamoaning muammosini tinglaydi va yechim topishga yordam beradi.
- Yaxshi natijalarni e'tirof etadi va tan oladi.
- Qiyinchiliklarni resurs bilan yengillashtiradi: vaqt, yordamchi, maslahat.
- Adolatni saqlaydi: ko'p ishlagan a'zoning hissasi qadrlanadi.

#### Amaliy misol

Kechikkan a'zoga darhol tanbeh bermay, avval sababini aniqlab, yordam yoki yo'l-yo'riq beradi.

#### Ko'p uchraydigan xato

Faqat tanqid qilish va ijobiy natijani e'tirof etmaslik.

## 4. Nazorat qiluvchi rahbar

Nazorat — ishonmaslik emas, erta ogohlantirish mexanizmi

8.4

- Muddatlar bo'yicha oraliq tekshiruv nuqtalarini belgilaydi.
- Ish natijasini aniq mezon asosida baholaydi.
- Kechikish sabablarini erta aniqlaydi.
- Sifat tekshiruvini jarayonning o'ziga joylashtiradi — faqat yakunda emas.

### Amaliy misol

Haftalik holat yig'ilishi kechikishni bir hafta ichida ko'rsatadi — bir oy o'tgach emas.

### Ko'p uchraydigan xato

Nazoratni faqat yakunda qilish; tuzatish uchun vaqt qolmaydi.

## 5. Nizolarni hal qiluvchi rahbar

“Kim aybdor?”dan “Nima ishlamayapti?” savoliga o'tish

8.4

- Nizo belgilarini erta sezadi: sukut, norozilik, passiv qarshilik.
- Muammoni shaxsga emas, vazifaga bog'laydi.
- Taraflarni tinglaydi va kelishuv variantlarini taklif qiladi.
- Qaror mezonini aniqlaydi: qoidalar, maqsad va adolat.

### Amaliy misol

Ikki a'zo vazifa ustida tortishsa, mas'uliyat qayta taqsimlanadi va yozma ravishda aniqlashtiriladi.

### Ko'p uchraydigan xato

“O'zi o'tib ketadi” deb nizoni e'tiborsiz qoldirish.

# Motivatsiya — jamoani harakatga keltiruvchi kuch

Loyiha jamoasining ichki harakatlantiruvchi omili

8.4

| Tur         | Misol                        |
|-------------|------------------------------|
| Moddiy      | Mukofot, bonus               |
| Nomoddiy    | Maqtoʻv, tan olish           |
| Ijtimoiy    | Jamoadahurmat                |
| Rivojlanish | Tajriba va oʻsish imkoniyati |

Motivatsiya faqat mukofot emas — tan olish, hurmat va rivojlanish imkoniyati ham kuchli omillardir.

# Jamoada nizolar: sabab va oqibat

Nizo tabiiy; muhim jihat — uni qanday boshqarish

8.4

| Nizo sababi           | Oqibat           |
|-----------------------|------------------|
| Vazifalar noaniqligi  | Bahs-munozara    |
| Resurs yetishmasligi  | Raqobat          |
| Muloqot yetishmasligi | Tushunmovchilik  |
| Fikrlar farqi         | Qarama-qarshilik |

**To'g'ri boshqarilgan nizo → rivojlanish. E'tiborsiz qoldirilgan nizo → ishonchsizlik, kechikish va sifat pasayishi.**



# Nazorat savollari

8-bob bo'yicha o'zlashtirishni tekshirish

## SAVOLLAR

1 Loyiha resurslarini boshqarish tushunchasi nimani anglatadi va u loyiha muvaffaqiyatiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

2 Inson resurslarini rejalashtirishning asosiy maqsadi nimadan iborat?

3 Loyiha jamoasini shakllantirish jarayonida qaysi omillar eng muhim?

4 Jamoani rivojlantirish va boshqarish o'rtasidagi farq nimada?

5 Rahbarning jamoani boshqarishdagi asosiy rollari nimalardan iborat?

6 Motivatsiya jamoa samaradorligiga qanday ta'sir ko'rsatadi?

7 Nizolar nima sababdan yuzaga keladi va ularni boshqarish nega muhim?

8 RAM nima va loyiha boshqaruvida qanday ahamiyatga ega?

# Glossariy va yakuniy xulosa

8-bobning asosiy tushunchalari

GLOSSARIY

|                   |                                                                           |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Loyiha resurslari | Inson, moddiy, moliyaviy, axborot va vaqt imkoniyatlari.                  |
| Inson resurslari  | Loyiha rahbari, jamoa aʼzolari, mutaxassislar va maslahatchilar.          |
| Loyiha jamoasi    | Loyiha maqsadiga erishish uchun birgalikda ishlovchi insonlar guruhi.     |
| RAM               | Vazifalar va jamoa aʼzolari oʻrtasida masʼuliyatni koʻrsatuvchi matritsa. |
| Motivatsiya       | Faol va samarali ishlashga undovchi ichki va tashqi omillar.              |

|                    |                                                                        |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Rahbarlik          | Jamoani maqsadga yoʻnaltirish va ragʻbatlantirish qobiliyati.          |
| Muvofiqlashtirish  | Aʼzolar ishini uygʻunlashtirish va bogʻliqliklarni boshqarish.         |
| Nizo               | Manfaat, fikr yoki resurslar toʻqnashuvi natijasidagi kelishmovchilik. |
| Jamoa barqarorligi | Bosim va muammolarga qaramay samarali ishlash qobiliyati.              |
| Loyiha rahbari     | Rejalashtirish, bajarilish va natijalar uchun masʼul shaxs.            |

Xulosa: loyiha resurslarini boshqarishning markazida “toʻgʻri inson — toʻgʻri vazifa — toʻgʻri vaqt — aniq masʼuliyat” tamoyili turadi.
