


9-BOB

LOYIHA KOMMUNIKATSIY ASINI BOSHQARISH

Axborot • fikr-mulohaza • hisobot •
kommunikatsiya rejasi

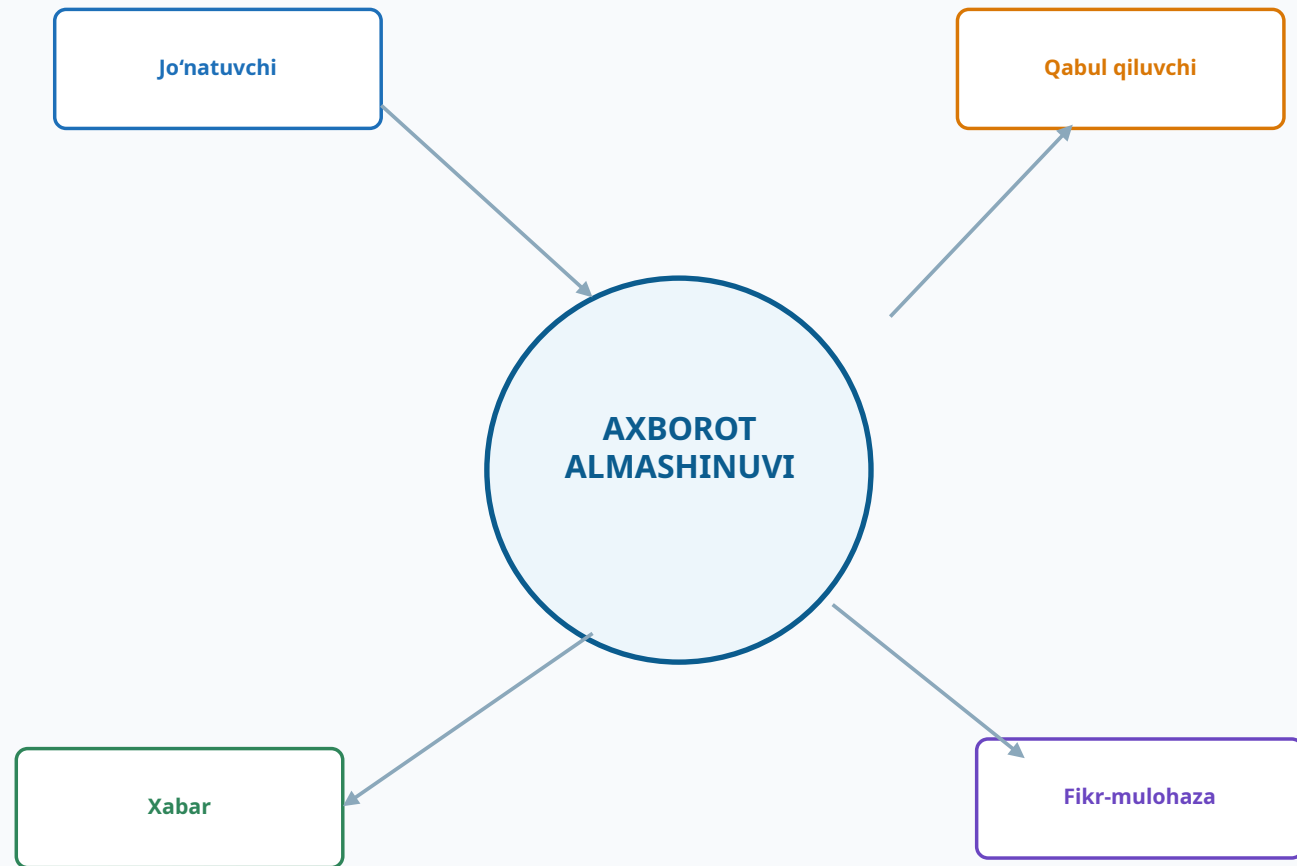

Mavzu tuzilishi

9-bob doirasidagi asosiy bo'limlar

9-BOB

9.1

Loyiha kommunikatsiyasini boshqarish tushunchasi va uning ahamiyati

9.2

Kommunikatsiyani rejalashtirish va modellarni qo'llash

9.3

Ma'lumot tarqatish va fikr-mulohaza almashish

9.4

Bajarilish hisobotlarini boshqarish

Tayanch iboralar

Mavzuni o'zlashtirish uchun asosiy tushunchalar

TAYANCH

Loyiha kommunikatsiyasi	Axborot oqimi	Manfaatdor tomonlar	Kommunikatsiya rejasi
Kommunikatsiya modeli	Jo'natuvchi	Qabul qiluvchi	Xabar
Fikr-mulohaza	Axborot kanali	Ma'lumot tarqatish	Bajarilish hisoboti
Axborot ehtiyoji	Ochiq muloqot	Kommunikatsiya samaradorligi	Monitoring axboroti
Axborot yuklamasi	Risklarni kamaytirish		

Loyiha kommunikatsiyasini boshqarish nima?

Axborot oqimlarini tartibga soluvchi va qarorlarni ishonchli ma'lumot bilan ta'minlovchi tizim

9.1

To'g'ri axborot

Kerakli ma'lumot mazmunan aniq, ishonchli va noto'g'ri talqinga yo'l qo'ymaydigan shaklda bo'lishi kerak.

O'z vaqtida yetkazish

Axborot qaror qabul qilinishi va ish bajarilishi uchun kerak bo'lgan paytda manfaatdor tomonga yetib boradi.

Kerakli shakl va auditoriya


Bir xil ma'lumot ham loyiha jamoasi, rahbariyat va buyurtmachi uchun turlicha darajada batafsil va turlicha formatda taqdim etiladi.

Kommunikatsiya — xabar yuborish emas; yaratish → qayta ishlash → uzatish → qabul qilish → talqin → fikr-mulohaza jarayonidir.

Nega kommunikatsiya markaziy mexanizm?

Rejalashtirish, ijro va nazorat samaradorligi axborot almashinuviga bog'liq

9.1

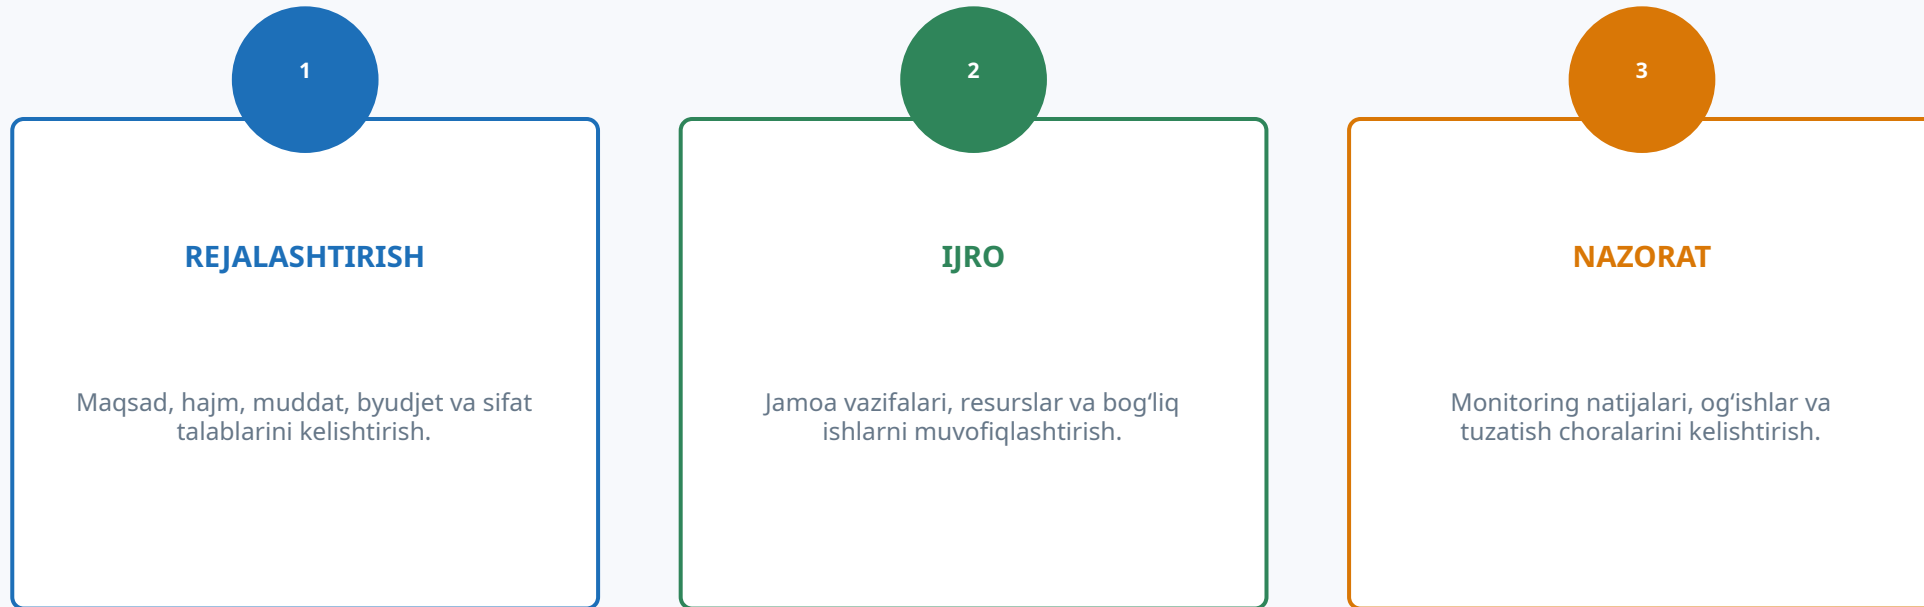

Axborot uzilishi — bog'langan vazifalar zanjiridagi uzilishdir.

Rejalashtirish bosqichida kommunikatsiya

“Umumiy tushuncha maydoni”ni shakllantirish

9.1

Kelishiladigan elementlar

- loyiha maqsadlari
- loyiha hajmi
- muddatlar
- byudjet
- sifat talablari

Asosiy boshqaruv savollari

Kimga?
Qachon?
Qaysi formatda?
Qanday mazmunda?
Kim yuboradi?

Oldini olinadigan ziddiyatlar

“Biz bunday kelishmagandik.”
“Boshqa natija kutgandik.”
“Bu vazifa kimga tegishli?”
“Qachon topshirish kerak edi?”

Dastlabki kommunikatsiya — manfaatdor tomonlar kutilmalarini boshqarishning asosiy vositasi.

Bajarish bosqichida kommunikatsiya

Jamoaning kundalik hamkorligi va vazifalar zanjirini birlashtiradi

9.1

Texnik yechim

Texnik vazifalar va yechimlar

Hujjatlash

Hujjatlar, protokollar, versiyalar

Moliya

Xarajatlar va moliyaviy ma'lumotlar

Ta'minot

Resurs va xarid ehtiyojlari

Bir yo'nalishdagi to'g'ri ish ham axborot almashinuvi bo'lmasa umumiy natijani ta'minlamaydi.

Axborot uzilishi → kechikish → takroriy ish → noto'g'ri qaror → xarajat oshishi.

Nazorat bosqichida kommunikatsiya

Monitoring axborotini qarorga aylantirish

9.1

1

Monitoring

Haqiqiy holat bo'yicha ma'lumot yig'iladi.

2

Og'ishni aniqlash

Reja va haqiqiy natija solishtiriladi.

3

Sababni izohlash

Og'ishning sababi manfaatdor tomonlarga tushuntiriladi.

4

Tuzatish chorasi

Kelishilgan korrekativ harakat amalga oshiriladi.

Muammo erta xabar qilinsa — kichik resurs bilan bartaraf etiladi; kechiksa — inqiroz darajasiga chiqishi mumkin.

Kommunikatsiya muammolari qanday oqibat beradi?

Ko'pincha texnik nuqson emas, axborot almashinuvidagi xato loyihani sekinlashtiradi

9.1

Kech axborot

Jamoa eski yoki noto'g'ri yo'nalishda ishlaydi.

Noto'liq axborot

Vazifa talablari to'liq tushunilmaydi.

Tushunarsiz ifoda

Bir xil topshiriq turlicha talqin qilinadi.

Qayta ishlash


Xatolarni tuzatish vaqt va xarajatni oshiradi.

Qayta ishlash (rework) vaqt, xarajat va sifatga bir vaqtning o'zida salbiy ta'sir qiladi.

Kommunikatsiya — ikki tomonlama jarayon

“Axborot yuborildi” ≠ “axborot qabul qilindi va to‘g‘ri tushunildi”

9.1

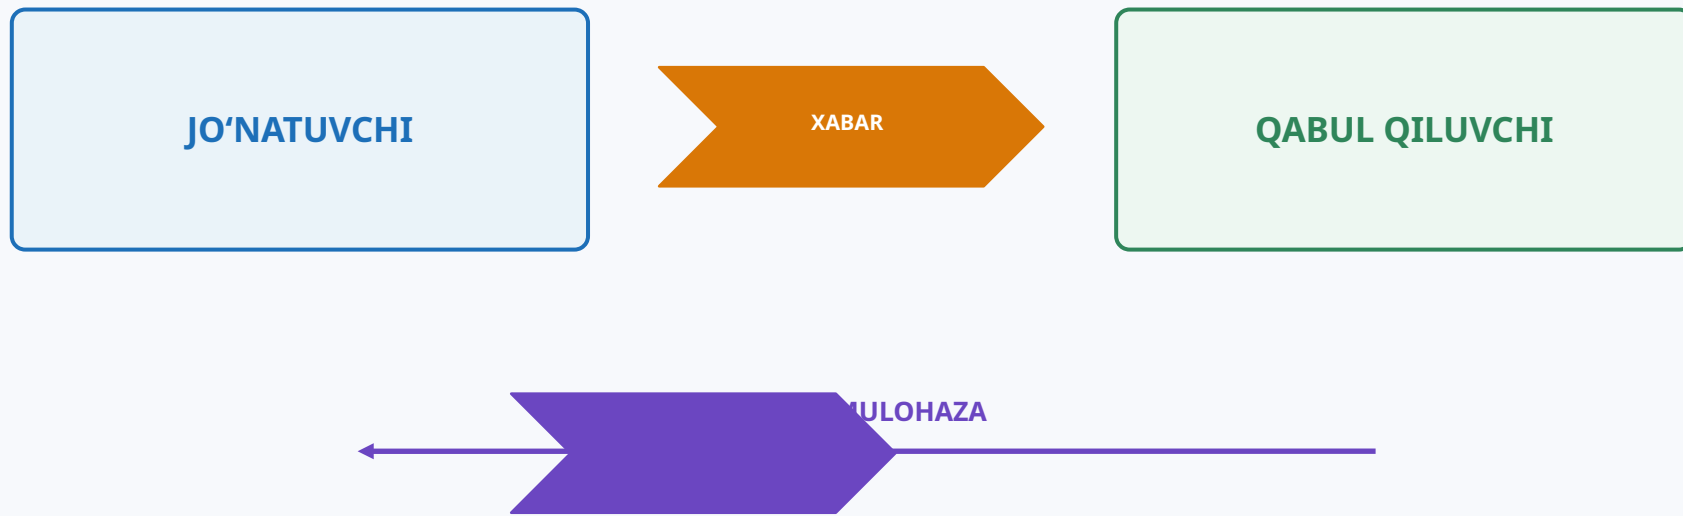

Fikr-mulohaza xabarni aniqlashtiradi, xatoni erta aniqlaydi va noto‘g‘ri qaror ehtimolini kamaytiradi.

Og'zaki va yozma kommunikatsiya

Tezkorlik va rasmiylik o'rtasida muvozanat zarur

9.1

Og'zaki muloqot

USTUNLIK: tezkor muhokama, savol-javob, darhol aniqlashtirish.

XAVF: hujjatlashtirilmasa unutish, inkor etish yoki turlicha eslab qolish ehtimoli oshadi.

Yozma kommunikatsiya

USTUNLIK: izchillik, rasmiylik, isbotlanuvchanlik va keyin qayta ko'rish imkoniyati.

XAVF: ortiqcha byurokratiya jarayonni sekinlashtirishi va axborot yuklamasini oshirishi mumkin.

Eng samarali kombinatsiya: tezkor muhokama → aniq kelishuv → muhim qarorni rasmiylashtirish.

9.2

KOMMUNIKATSI YANI REJALASHTIRIS H

**Kimga qanday ma'lumot kerak? Qachon? Qaysi shaklda?
Kim tayyorlaydi?**

Darslikning 9-bobi asosida

Kommunikatsiyani rejalashtirishning asosiy savollari

Axborot tartibsiz emas, oldindan belgilangan tizim asosida harakat qiladi

9.2

Kimga?

Qaysi manfaatdor tomon axborotni oladi?

Nima?

Qanday mazmundagi axborot kerak?

Qachon?

Qanday davriylikda yetkaziladi?

Qaysi kanal?

Uchrashuv, telefon, email, messenjer, platforma?

Kim tayyorlaydi?

Mas'ul shaxs kim?

Qaysi shaklda?


Xulosa, jadval, grafik, rasmiy hisobot?

Kommunikatsiya rejasi bo'lmasa muhim axborot yo'qoladi yoki keraksiz axborot ortiqcha yuklama yaratadi.

9.1-rasm. Kommunikatsiya modeli

Darslikdagi original chizma

9.2

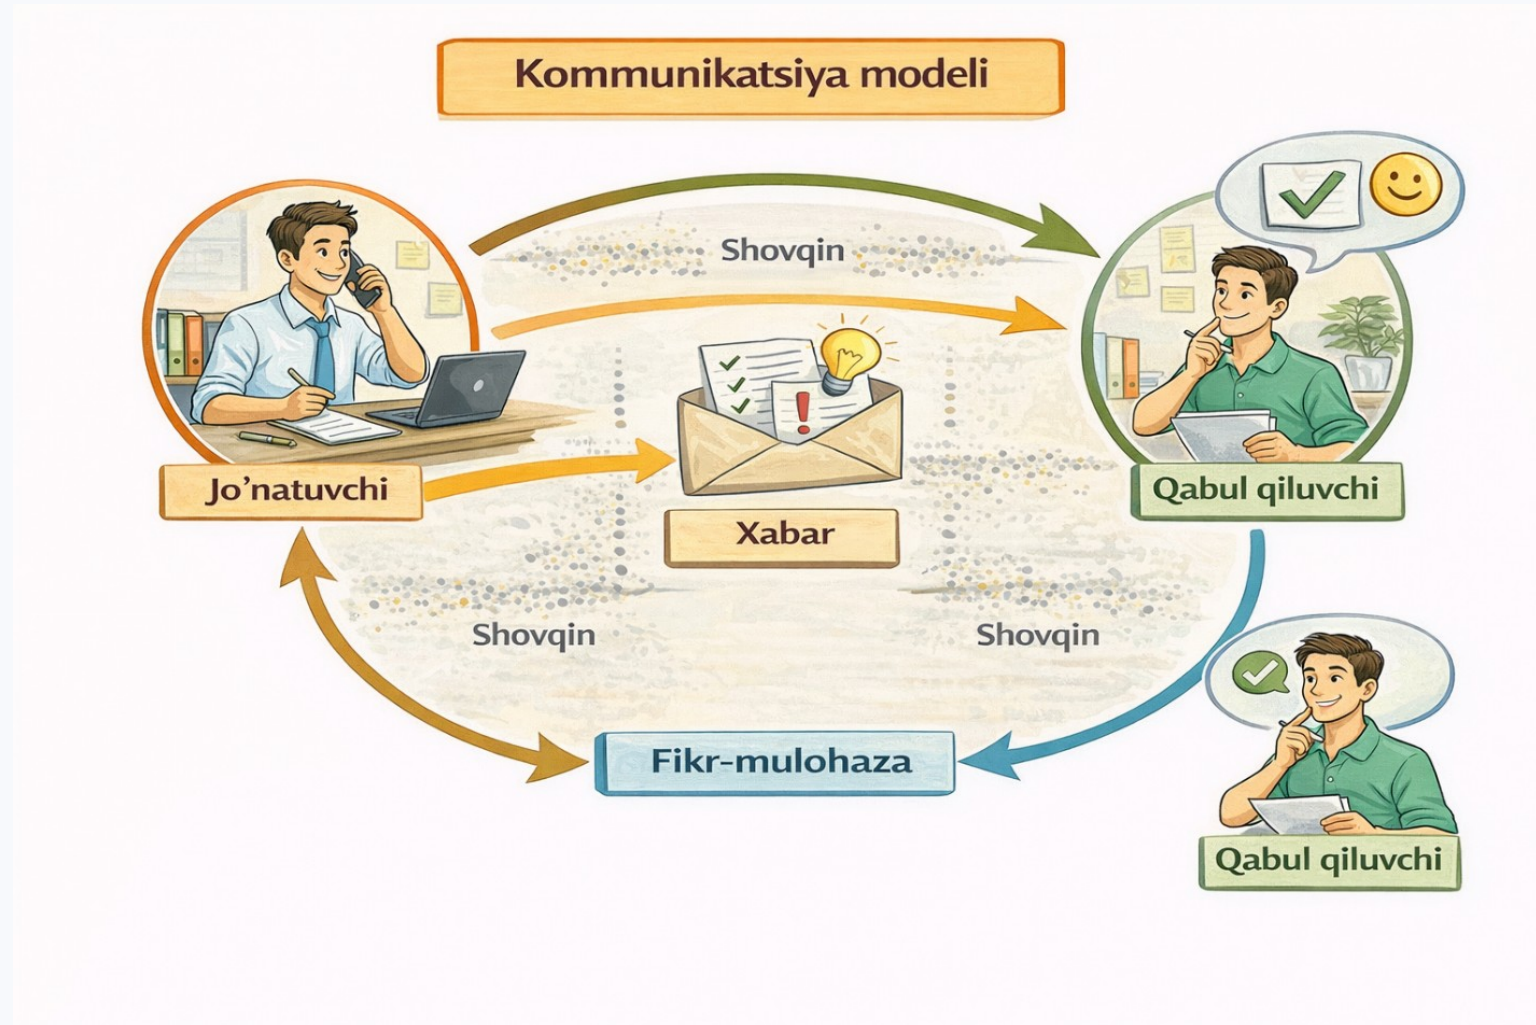

Kommunikatsiya modelining elementlari

Jo'natuvchi → xabar → qabul qiluvchi → fikr-mulohaza

9.2

Jo'natuvchi

Axborotni shakllantiradi va uzatadi.

Xabar

Uzatilayotgan mazmun va topshiriq.

Qabul qiluvchi

Xabarni qabul qiladi va talqin etadi.

Fikr-mulohaza

Xabar qanday tushunilganini ko'rsatadi.

Shovqin

Axborotni buzuvchi, susaytiruvchi yoki chalg'ituvchi omillar.

Modeldan amaliy foydalanish

Muammo ijrochida emas, xabarni yetkazish shaklida bo'lishi mumkin

9.2

Kuzatilayotgan holat	Ehtimoliy kommunikatsion sabab	Boshqaruv yechimi
Topshiriq doim noto'g'ri bajariladi	Xabar noaniq yoki yetarlicha konkret emas	Vazifani mezonlar bilan qayta ifodalash
Jamoa turlicha natija tayyorlaydi	Bir xil xabar turlicha talqin qilinadi	Fikr-mulohaza va tasdiqlash talab qilish
Qaror kechikadi	Axborot kerakli shaxsga kech yetadi	Kanal va davriylikni qayta belgilash
Ko'p qayta ishlash mavjud	Muhim o'zgarishlar hujjatlashtirilmagan	Versiya va qarorlarni qayd etish

Kommunikatsiya jarayoni doimiy tahlil va moslashtirishni talab qiladi.

9.3

MA'LUMOT TARQATISH VA FIKR- MULOHAZA

Har bir manfaatdor tomonning axborot ehtiyoji va qaror qabul qilish roli turlicha.

Darslikning 9-bobi asosida

Axborot ehtiyoji hamma uchun bir xil emas

Mazmun, tafsilot darajasi va format auditoriyaga moslashtiriladi

9.3

Loyiha jamoasi

Batafsil va tezkor operativ ma'lumot: ish hajmi, muddatlar, resurslar, risklar, joriy muammolar.

Rahbariyat

Umumlashtirilgan va tahliliy axborot: asosiy ko'rsatkichlar, byudjet, muddatlar, muhim risklar.

Buyurtmachi

Natijaga yo'naltirilgan axborot: tayyor mahsulot, sifat, kelishilgan talablar va muddatga rioya.

Axborot filtrlanadi: qaror uchun zarur bo'lgan ma'lumot yetkaziladi, ortiqcha yuklama kamaytiriladi.

Loyiha jamoasi uchun axborot

Kundalik ishni bajarishga yordam beradigan operativ tafsilotlar

9.3

Ish hajmi

Qaysi vazifalar bajariladi?

Muddatlar

Qachon tugallanishi kerak?

Resurslar

Nima va kim mavjud?

Risklar

Qanday xavflar joriy ishga ta'sir qilmoqda?

Muammolar

Qanday to'siqlar tezkor yechim talab qiladi?

O'zgarishlar

Talab yoki ustuvorlikda nima o'zgardi?

Kechiktirilgan yoki haddan tashqari umumiy axborot — xatolar va takroriy ishlar manbai.

Rahbariyat uchun axborot

Tafsilot emas, boshqaruv qarori uchun konsentrlangan ko'rsatkichlar

9.3

Loyiha holati

Umumiy holat: reja bo'yicha /
og'ish mavjud

Byudjet

Reja-haqiqat va asosiy
xarajat og'ishlari

Muddat

Kritik kechikishlar va jadval
holati

Risklar

Yuqori ta'sirli asosiy xavflar

Qarorlar

Rahbariyat tasdig'ini talab
qiluvchi masalalar

“Axborotni filtrlash” tamoyili — ortiqcha tafsilot emas, qaror uchun zarur signal.

Buyurtmachi uchun axborot

Asosiy e'tibor — natija, sifat va muddat

9.3

Natija

Loyiha mahsuloti yoki xizmatida nimalar tayyor bo'ldi? Kelishilgan natijaga qanchalik yaqinlashildi?

Sifat

Natija kelishilgan sifat talablari va qabul mezonlariga mosmi?

Muddat

Topshirish sanalari va bosqichlar reja bo'yicha bajarilmoqdam?

Haddan tashqari texnik tafsilot buyurtmachida chalkashlik yoki ishonchsizlik keltirib chiqarishi mumkin.

Manfaatdor tomonlar bo'yicha axborot profili

Auditoriyaga mos kommunikatsiya

9.3

Tomon	Asosiy ehtiyoj	Tafsilot darajasi	Mos format
Loyiha jamoasi	Vazifa, muddat, resurs, risk, muammo	Yuqori	Tezkor xabar, task-board, qisqa yig'ilish
Rahbariyat	Holat, KPI, byudjet, jadval, muhim risk	O'rta / umumlashtirilgan	Dashboard, qisqa hisobot, taqdimot
Buyurtmachi	Natija, sifat, muddat, kelishuvlar	Soddalashtirilgan	Natijaviy hisobot, demo, rasmiy xat

Bir xil axborotni hamma uchun bir xil shaklda yuborish — samarali kommunikatsiya emas.

Fikr-mulohaza nima uchun zarur?

Bir tomonlama uzatish xabarining to'g'ri tushunilganini kafolatlamaydi

9.3



Fikr-mulohaza xatoni aniqlaydi, tushunmovchilikni bartaraf etadi va axborot oqimini takomillashtiradi.

Fikr-mulohaza almashish shakllari

Vosita maqsad va auditoriyaga mos tanlanadi

9.3

Yig'ilishlar

Haftalik, oylik yoki bosqich yakuni bo'yicha bevosita muhokama.

Hisobot va yozma aloqa

Axborotni rasmiylashtirish, hujjatlashtirish va keyin tekshirish imkoniyati.

Muhokamalar

Muammo, g'oya va o'zgarishlarni birgalikda ko'rib chiqish.

Elektron vositalar

Email, messenjer va loyiha platformalari orqali tezkor fikr almashish.

Vositalar rejalashtirilgan, aniq maqsadli va auditoriyaga mos qo'llanishi kerak.

Kommunikatsiya kanalini tanlash

Tezkorlik, rasmiylik va qayd etish ehtiyoji bo'yicha

9.3

Kanal	Qachon ma'qul?	Kuchli tomoni	Ehtiyot bo'lish kerak
Uchrashuv	Murakkab muhokama, kelishuv	Savol-javob va aniqlashtirish	Protokolsiz qaror yo'qolishi mumkin
Telefon / messenjer	Tezkor ish masalalari	Juda tezkor	Muhim qarorni keyin rasmiylashtirish kerak
Email / rasmiy xat	Tasdiq, kelishuv, muhim xabar	Qayd va izchillik	Haddan ortiq yozishma yuklama beradi
Platforma	Vazifa va hujjat aylanishi	Markazlashgan kuzatuv	Tartibli foydalanish qoidasi zarur

**Hisobot — ma'lumot yig'indisi emas, boshqaruv qarorini
qo'llab-quvvatlovchi vosita.**

Darslikning 9-bobi asosida

Bajarilish hisoboti nima?

Loyiha holati va og'ishlar haqidagi boshqaruv axboroti

9.4

Jadval

Muddatlar va reja bajarilishi

Xarajatlar

Byudjet va xarajat og'ishlari

Bajarilgan ish

Natijalar va tayyor ish hajmi

Muammolar

Hal qilinishi kerak bo'lgan to'siqlar

Risklar

Ehtimoliy salbiy hodisalar va javob choralari

Hisobotning vazifasi — “nima bo'ldi?”ni emas, “qanday qaror kerak?”ni ko'rsatish.

Samarali hisobot xususiyatlari

Axborot hajmi va qaror qiymati o'rtasidagi muvozanat

9.4

Aniq

Faktlar, ko'rsatkichlar va og'ishlar tushunarli hamda bir ma'noli ifodalangan.

Tushunarli

Auditoriya tilida, ortiqcha texnik terminlarsiz va mantiqiy tuzilmada taqdim etilgan.

Yetarli darajada batafsil

Qaror uchun zarur tafsilot bor, lekin axborot yuklamasini oshiruvchi keraksiz detallar yo'q.

Ortiqcha tafsilot — axborot yuklamasi; yetarli ma'lumotning yo'qligi — noto'g'ri xulosa xavfi.

Bajarilish hisobotining tavsiya etiladigan tuzilishi

Darslikdagi mazmunga asoslangan amaliy shablon

9.4

Bo'lim	Hisobotda nimalar ko'rsatiladi?
1. Umumiy holat	Loyiha statusi va qisqa xulosa
2. Jadval	Reja, amaldagi holat, kechikishlar
3. Xarajat	Byudjet, real sarf, og'ishlar
4. Bajarilgan ish	Bosqichlar, tayyor deliverable va natijalar
5. Muammolar	Sabab, ta'sir, javobgar, yechim
6. Risklar	Muhim risklar va rejalashtirilgan choralar
7. Qarorlar	Manfaatdor tomonlardan talab qilinadigan tasdiq yoki qaror

Manfaatdor tomonlar uchun kommunikatsiya rejasi

Axborot almashinuvini “o‘z-o‘zidan” jarayondan boshqariladigan tizimga aylantiradi

9.4

Buyurtmachi

Rahbariyat

**KOMMUNIKATSIYA
REJASI**

Loyiha jamoasi

Hamkorlar

Reja “hamma uchun bir xil ma’lumot” emas, har bir tomonning ehtiyoji va qaror roliga mos axborotni belgilaydi.

Nega kommunikatsiya rejasi zarur?

Axborotdagi 4 asosiy nosozlikni tizimli ravishda kamaytiradi

9.4

Kech yetib borishi

Qaror va ishlar kechikadi.

Noto'liq bo'lishi

Vazifa noto'g'ri tushuniladi.

Noto'g'ri tushunilishi

Bir xabar turlicha talqin qilinadi.

Umuman yetkazilmasligi

Manfaatdor tomon qarordan chetda qoladi.

Kommunikatsiya rejasi axborot almashinuvini "qoidaga" aylantiradi.

Kommunikatsiya xatosi → loyiha oqibati

Darslikdagi amaliy vaziyatlar

9.4


Vaziyat	Kommunikatsion muammo	Oqibat
Buyurtmachi o'zgarishdan vaqtida xabardor emas	O'zgarish kech yetkazildi	Keyinchalik e'tiroz va qayta ishlash
Jamoa vazifa ustuvorligini tushunmaydi	Ustuvorlik aniq berilmagan	Eng muhim ishlar kechikadi
Rahbariyat loyiha holatini aniq bilmaydi	Hisobot yetarli emas yoki kech	Noto'g'ri boshqaruv qarori

Reja nafaqat xabar almashinuvini, balki axborot yuklamasini ham boshqaradi.

9.2-rasm. Kommunikatsiya rejasini tuzish jarayoni

Darslikdagi original chizma

9.4

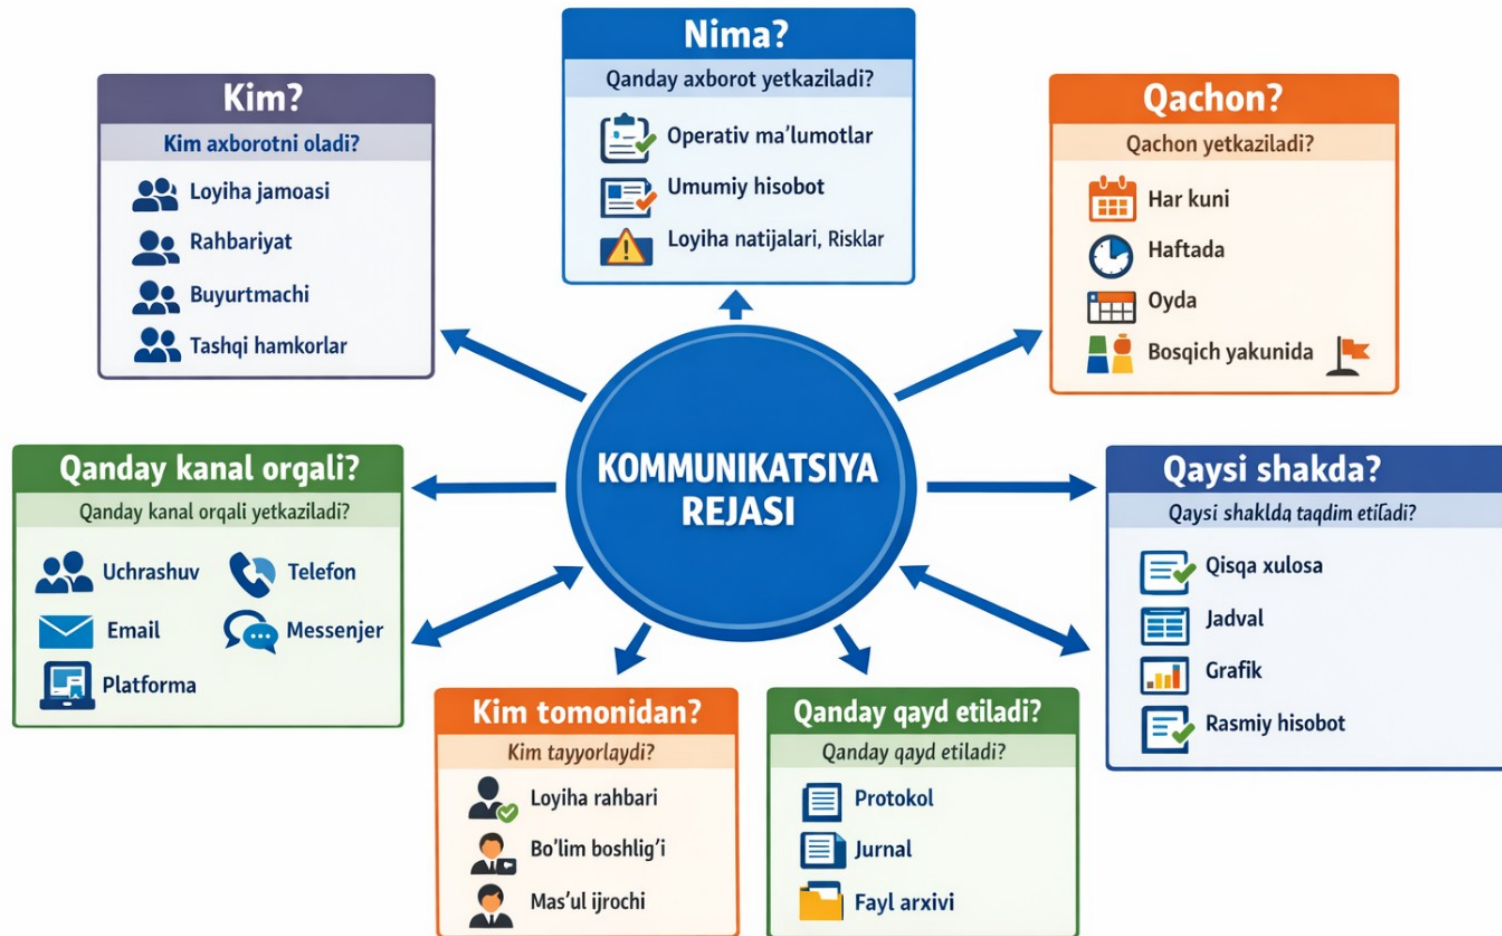

Yaxshi kommunikatsiya rejasi nimani aniq belgilaydi?

7 ta amaliy savol

9.4

1. Kim?

Axborotni qaysi manfaatdor tomon oladi?

2. Nima?

Qanday mazmundagi axborot yetkaziladi?

3. Qachon?

Davriylik: har kuni, haftada, oyda, bosqichda?

4. Qanday kanal?

Uchrashuv, telefon, email, messenjer, platforma?

5. Kim tomonidan?

Kim tayyorlaydi, tekshiradi va yuboradi?

6. Qaysi shaklda?

Xulosa, jadval, grafik yoki rasmiy hisobot?

7. Qanday qayd etiladi?

Protokol, jurnal, fayl arxivi va versiya boshqaruvi?

Kommunikatsiya rejasi tarkibi

Darslik tavsiya etgan asosiy bo'limlar

9.4

Manfaatdor tomonlar

Ro'yxat, loyiha roli va axborot ehtiyoji.

Axborot turlari

Holat, jadval, xarajat, risk, sifat, o'zgarish, muammo.

Kanallar va formatlar

Rasmiy hujjat va tezkor xabar qaysi holatda ishlatiladi.

Davriylik va vaqt

Har kuni, haftada, oyda yoki bosqich yakunida.

Mas'ullar

Kim tayyorlaydi, tekshiradi va yuboradi.

Fikr-mulohaza

Tasdiqlash, e'tiroz va aniqlashtirish tartibi.

Saqlash qoidalari

Fayl joyi, versiya, arxiv va maxfiylik.

Kommunikatsiya rejasi qanday ishlab chiqiladi?

7 bosqichli amaliy ketma-ketlik

9.4

1

Manfaatdor tomonlarni aniqlash

2

Axborot ehtiyojini aniqlash

3

Axborot muhimligini ajratish

4

Kanal tanlash

5

Davriylikni belgilash

6

Mas'ulni tayinlash

7

Qayta ko'rib chiqish

Loyiha o'zgarsa, kommunikatsiya rejasi ham moslashtiriladi.

Axborot muhimligini ajratish

Tezkor, o'rta va strategik darajalar

9.4

Tezkor axborot

Zudlik bilan yetkaziladi. Masalan: kritik muammo, resurs yetishmasligi, bugungi vazifadagi to'siq.

O'rta muddatli axborot

Odatda haftalik. Masalan: vazifalar bajarilishi, jadval holati, jamoa muammolari.

Strategik axborot

Odatda oylik yoki bosqich yakunida. Masalan: umumiy natija, byudjet, yirik risklar, rahbariyat qarori.

Ortiqcha uchrashuv ham zarar, kam kommunikatsiya ham zarar — muvozanat kerak.

Amaliy misol: “Turistik marshrut yaratish”

Talabalar jamoasi uchun kommunikatsiya rejasi

9.4

Rahbariyat (kafedra)

Oyiga 1 marta
Qayergacha kelindi? Muammo nima?

Buyurtmachi (hostel)

Haftada 1 marta
Tayyor materiallar va kelishiladigan masalalar

Jamoa a'zolari

Har 2 kunda
Kim nima qilyapti? Muddatlar qanday?

Taqdimot guruhi

Yakuniy haftada har kuni
Slaydlar, matn va dizaynni muvofiqlashtirish

Oldindan rejalashtirish “kimga aytmagandik?” va “qachon kelishgandik?” kabi muammolarni keskin kamaytiradi.

Amaliy kommunikatsiya matritsasi

“Turistik marshrut yaratish” loyihasi misolida

9.4

Tomon	Axborot	Davriylik	Kanal / format	Mas’ul
Kafedra rahbariyati	Holat, muammo, zarur qaror	Oyiga 1 marta	Qisqa hisobot / uchrashuv	Loyiha rahbari
Hostel buyurtmachisi	Tayyor natija, kelishuv	Haftada 1 marta	Email + qisqa uchrashuv	Mijoz bilan aloqa mas’uli
Jamoa a’zolari	Vazifa, muddat, to’siq	Har 2 kunda	Messenjer / task-board	Jamoa yetakchisi
Taqdimot guruhi	Slayd, matn, dizayn	Yakuniy haftada har kuni	Uchrashuv / umumiy fayl	Taqdimot koordinatori

To'g'ri kommunikatsiya qanday qiymat yaratadi?

Axborotdan boshqaruv natijasigacha

9.4

Ishonch

Manfaatdor tomonlar loyiha holatini tushunadi va kutilmalar moslashadi.

Tez qaror

Kerakli ma'lumot kerakli vaqtda qaror qabul qiluvchiga yetadi.

O'zgarishlarni boshqarish

O'zgarishlar vaqtida kelishiladi va hujjatlashtiriladi.

Riskni kamaytirish

Muammolar erta aniqlanadi, noto'g'ri talqin va kechikish kamayadi.

Kommunikatsiya rejasi axborotni "tasodifiy harakat"dan "boshqariladigan tizim"ga aylantiradi.

Nazorat savollari

9-bobni mustahkamlash uchun

NAZORAT

1

Loyiha kommunikatsiyasini boshqarish nimani anglatadi va uning loyiha muvaffaqiyatidagi o'rnini qanday?

2

Loyiha jarayonida kommunikatsiya muammolari nima sababdan ko'p uchraydi?

3

Kommunikatsiya jarayoni nima uchun ikki tomonlama jarayon hisoblanadi?

4

Kommunikatsiya modellarining mohiyati nimada va ular amaliyotda qanday qo'llaniladi?

5

Ma'lumot tarqatishda manfaatdor tomonlarning axborot ehtiyojlarini hisobga olish nima uchun muhim?

6

Bajarilish hisobotlari loyiha boshqaruvida qanday vazifani bajaradi?

7

Kommunikatsiya rejasi nima va u loyiha jarayoniga qanday ta'sir ko'rsatadi?

8

To'g'ri tashkil etilgan kommunikatsiya loyiha risklarini kamaytirishda qanday rol o'ynaydi?

Glossariy I

Asosiy kommunikatsiya tushunchalari

GLOSSARIY

Loyiha kommunikatsiyasi

Axborotni yaratish, uzatish, qabul qilish va tushunishni ta'minlovchi muloqot jarayonlari.

Axborot almashinuvi

Loyiha ishtirokchilari o'rtasida ma'lumotlarning uzatilishi va qabul qilinishi.

Jo'natuvchi

Axborotni shakllantiruvchi va uzatuvchi shaxs yoki guruh.

Xabar

Kommunikatsiya jarayonida uzatiladigan axborot mazmuni.

Loyiha kommunikatsiyasini boshqarish

Axborot almashinuvini rejalashtirish, tashkil etish va nazorat qilish jarayonlari.

Kommunikatsiya modeli

Jo'natuvchi, xabar, qabul qiluvchi va fikr-mulohazani ifodalovchi nazariy tuzilma.

Qabul qiluvchi

Axborotni qabul qiluvchi va talqin qiluvchi shaxs yoki guruh.

Fikr-mulohaza

Xabar olingani va qanday tushunilganini ko'rsatuvchi javob reaksiyasi.

Glossariy II

Axborot, hisobot va rejalashtirish tushunchalari

GLOSSARIY

Ma'lumot tarqatish

Axborotni manfaatdor tomonlarga yetkazish jarayoni.

Bajarilish hisoboti

Holat, natijalar, og'ishlar va muammolarni aks ettiruvchi rasmiy hujjat.

Manfaatdor tomonlar

Loyihaga ta'sir ko'rsatuvchi yoki natijalaridan manfaatdor shaxs va tashkilotlar.

Axborot ehtiyoji

Qaror qabul qilish uchun zarur ma'lumotlar majmui.

Ochiq muloqot

Axborotni erkin va to'siqsiz almashish muhiti.

Axborot kanali

Uchrashuv, email, rasmiy hujjat, platforma kabi xabar yetkazish vositasi.

Hisobot berish

Loyiha natijalari va jarayonlari haqida manfaatdor tomonlarga axborot taqdim etish.

Kommunikatsiya rejasi

Qaysi axborot kimga, qachon, qanday shaklda va qaysi kanal orqali yetkazilishini belgilovchi hujjat.

Axborot yuklamasi

Ishtirokchilarga kelib tushayotgan axborot hajmi.

Kommunikatsiya samaradorligi

Axborotning o'z vaqtida, to'g'ri va tushunarli yetkazilishi darajasi.

Yakuniy xulosa

9-bobning asosiy mantiqi

XULOSA

1

Kommunikatsiya — loyiha boshqaruvining markaziy mexanizmi.

2

Samarali axborot aniq, o'z vaqtida, auditoriyaga mos va ikki tomonlama bo'ladi.

3

Manfaatdor tomonlar turlicha axborot ehtiyojiga ega; "bir xil xabar — hamma uchun" yondashuvi samarasiz.

4

Bajarilish hisobotlari qaror qabul qilishni qo'llab-quvvatlashi kerak.

5

Kommunikatsiya rejasi kimga, nima, qachon, qaysi kanal, kim tomonidan, qaysi shaklda va qanday qayd etilishini belgilaydi.

To'g'ri kommunikatsiya → kamroq noaniqlik → tezroq qaror → kamroq qayta ishlash → yuqori loyiha samaradorligi.
